GĀJĒJU KUSTĪBAS UN SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS PLĀNS
3. KĀRTA, M 1:500

Objekta izvietojuma shēma

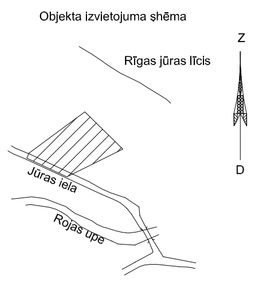

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

NR.PLĀNĀ	NOSAUKUMS
1	BRĪVDABAS ESTRĀDE
2	WC ĒKA
3	AUTOMOBIĻU STĀVVIETAS
4	AUTOBUSU STĀVVIETAS
5	BIO TUALEŠU LAUKUMS
6	ATKRITUMU KONTEINERU NOVIETNE
7	SKATĪTĀJU STĀVLAUKUMI
8	ATBALSTA SIENA

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	NOSAUKUMS
	1. KĀRTAS BŪVDARBU ROBEŽA
	2. KĀRTAS BŪVDARBU ROBEŽA
	ZEMES GABALA ROBEŽA
	PROJEKTĒJAMĀS ĒKAS
	PROJEKTĒJAMĀ BETONA BRUĢA IETVE
	PROJEKTĒJAMĀ BETONA BRUĢA BRAUKTUVE
	PROJEKTĒJAMAIS BETONA BRUĢA STĀVVIETAS SEGUMS
	PROJEKTĒJAMAIS "EKOLOG" TIPA SEGUMS
	PROJEKTĒJAMAIS OĻU SEGUMS
	PROJEKTĒJAMĀ GRANITS NOMALE GAR OSTAS IELU
	PROJEKTĒJAMAIS ZĀLIENS
	PROJ. NOGĀŽU NOSTIPRINĀJUMS AR KOKOSA ŠĶIEDRAS PAKLĀJU
	PROJEKTĒJAMĀS BETONA IELAS APMALES BR100,30,15
	PROJEKTĒJAMĀS BETONA IELAS APMALES BR100,22.15 h=0cm
	PROJEKTĒJAMĀS BETONA IELAS APMALES BR100,22.15 h=2cm
	PROJEKTĒJAMĀS BETONA IETVES APMALES BR100,20.8
	PROJEKTĒJAMĀS BETONA TEKNES
	PROJEKTĒJAMĀS PVC APMALES
	PROJEKTĒJAMĀS AUGSTĀSIEDZĪLINĀTĀS BETONA IELAS APMALES
	PROJEKTĒJAMĀS GŪLIJAS
	PROJEKTĒJAMAIS HORIZONTĀLAIS MARĶĒJUMS
206	PROJEKTĒJAMĀS CEĻAZĪMES
	ESOŠĀS CEĻA ZĪMES
	PROJEKTĒJAMIE STATĪVI
	DEMONTĒJAMĀS CEĻA ZĪMES
	PROJEKTĒJAMĀ NOGĀZE
	ESOŠO ELEMENTU DEMONTĀŽA
	PROJEKTĒJAMĀ ATKRITUMU TVERTNE
	PROJEKTĒJAMIE SOLIŅI
	PROJEKTĒJAMIE APSTĀDĪJUMI

Iepriekš izbūvētie segumi un elementi

- Betona bruģa brauktuve
- Betona bruģa stāvvieta
- Betona bruģa ietve
- Frēzējuma josla
- Asfalta brauktuve
- Asfalta ietve
- Grants nomale
- Nostiprinātais zālienss
- Zālienss
- Izbūvētas ķelas apmales / Izbūvētas ietves apmales / Izbūvētas betona teknes
- Iepriekš iestādīti krūmi vai koki
- Iepriekš uzstādītas atkritumu urnas
- Iepriekš uzstādīti soli

PIEZĪMES:
1. Izmēri doti metros;
2. Horizontālo marķējumu autostāvvietās izveidos ar atšķirīgas krāsas bruģi;
3. Gājēju pārejas un invalīdu stāvvietas horizontālie apzīmējumi jāuzkrāso ar atstarojošu krāsu;
4. Žogu un vārtus ap teritoriju jāizbūvē 1. būvdarbu kārtā;
5. Ceļa zīmes uzstādāmas atbilstoši standartu LVS 77-1:2016, LV S77-2:2016 un LVS 77-3:2016 prasībām;
6. Būvdarbu robežas atspoguļo segumu izbūves robežas.

KOPĒJAIS AUTOSTĀVVIETU SKAITS:

VIEGLAJĀM AUTOMAŠĪNĀM - 142 VIETAS
T. SK. INVALĪDIEM - 9 VIETAS
AUTOBUSIEM - 9 VIETAS

Nr.2 x=374635.398, y=427996.649, H=5.662

PIEZĪMES:
1. LKS-92 koordinātu sistēma, Mēroga koeficients 0,999600
2. LAS augstumu sistēma.
3. Uzmērīšana veikta 2015. gada 9.decembrī. Uzmērāmās teritorijas platība - 4,21 ha.
4. Inženierkomunikāciju datu ieguvei apsekotas dabā un saņemtas apkaimes organizācijas.
5. Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei.
6. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
7. Topogrāfiskie apzīmējumi atbilst atbilstoši 2012.gada 24.aprīļa LR Ministru kabineta noteikumu Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 1.pielikumam.
8. Uzmērīšanā izmantoti ar LatPos bāzes staciju Talsi korekcijām RTK režīmā noteiktie atbalsta punkti:
   Nr.1 x=374590.243, y=427909.064, H=6.099

LATVIJASMERNIEKS.LV				Pasūtījums: Estrāde Roja, Rojas novads
SIA "Latvijasmernieks.lv", reģ.nr.40003783960, Māza iela 4, Rīga, LV-1048 Zemes/kurzemes bāzes, K.Valdemāra iela 3a, Talsi, LV-3200 tālr.63221947				Pasūtījuma reģistrācijas Nr. 74966 Pasūtītājs: Rojas novada dome
Vadītājs	J.Rutkis		20.12.2015.	Topogrāfiskais plāns — Lapas 1
Sertificēta persona Jānis Rutkis, Nr. AC-000000032				
Mērnieks	J.Rutkis		09.12.2015.	Lapa 1
Plānu saskaņoja	A.TIss		05.01.2016.	Mērogs 1:500

DATI
Dati ievadīti pašvaldības vienotajā digitālajā kartē. Uzmērījums reģistrēts ar Nr.
8882 TP 55595
2016. gada 20. jūlijā
SIA "GeoDATI". Vasarnīcu iela 16, Ventspils, LV-3601 e-pasts:info@geodati.lv www.geodati.lv

SIA "MANTOJUMS"
Reģ. Nr. 40103049706
Būvkomersanta reģ. Nr. 1580-RA
Rīga, Ierīķu 43-8, LV1084
Tālr. 29477750
e-pasts: alvarstrekts@inbox.lv

Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Objekta nosaukums: Būvprojekta "Brīvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā" izmaiņas sadaļā/daļai kārtība 3. kārta Kadastra apzīmējums 8882 008 0728	Stadija: BP / Lapas Nr.: TS/GP 20 / Lapu sk.:
BPV				Adrese: Selgas iela 1, Roja, Rojas novads	Pasūtījuma Nr. Arhīva Nr.: RND/2018/L 19 (18-01/80) / Mērogs: 1:500 / Izmērogotā lapas Nr.:
BP Daļējā rekl.	V. Čipļika		05.04.2018	Pasūtītājs: Rojas novada dome	SIA "MODUS-R" Ezmaļa iela 7a-1, Rīga, LV-1046, Tālr. 67334079,Latvija, reģ.nr. 40003778119 būvkomersanta apl.nr. 09224R
Izpildītājs:	A.Treicis		05.04.2018	Lapas nosaukums: GĀJĒJU KUSTĪBAS UN SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS PLĀNS 3. KĀRTA	SIA "AVR ", reģ.nr. 40003105867 būvkomersanta apl.nr. 30668A Ja. Mīlera iela 82/1-3, Rīga , LV 1013 e: avrsia@inbox.lv, mob. 29296598

Proj. ūdensvada piesīlgumu izveidot pie sāeilpota ūdensvada ar diametru ne mazāku par 100 mm

0 20m 40m 60m 80m 100m
